Projektirányítás az informatikában

Ilyés Enikő - Langer Tamás nyomán

Formális és informális szervezetek

A formális szervezetek tulajdonos és vagy vezetői döntések alapján jönnek létre, szépen lerajzolhatóak.



- Az informális szervezetek spontán emberi kapcsolatok mentén jönnek létre.

- Mindkettő fontos egy vállalat életében és az utóbbira is nagyon oda kell figyelni.

3

Le tudnád rajzolni munkahelyed szervezeti felépítését?

Egyszerű szervezet

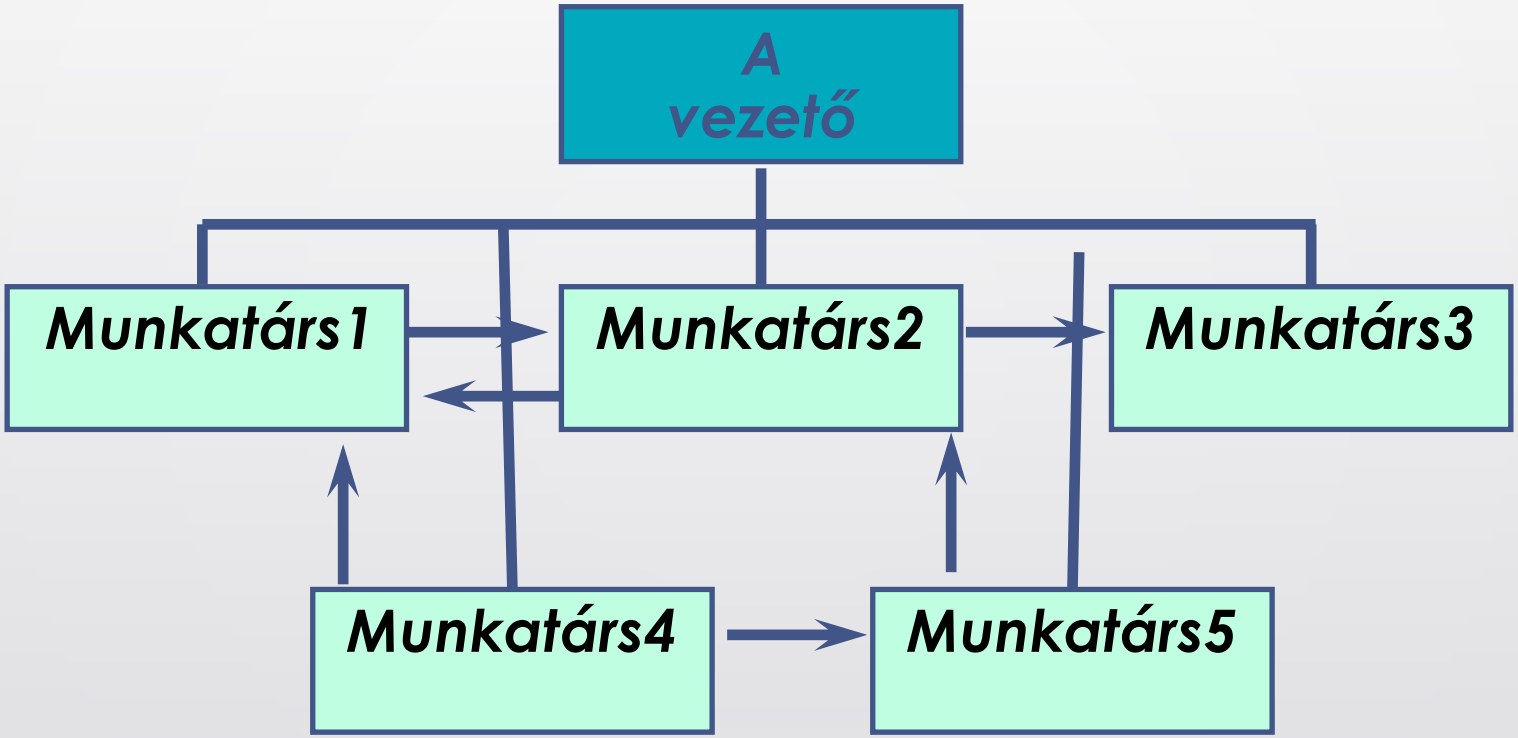

Egyszerű szervezet

Előnyök

- Centralizált vezetés, gyors döntés
- Rugalmas
- Könnyebben serkenti a csapatmunkát és a kreativitást
- A formális és informális szervezet jobban egybeesik

Hátrányok

- Bizonyos méreten túl nem működőképes
- Könnyen szervezetlenségbe csaphat át
- Kiszolgáltatottság az egyszemélyi vezetőnek
- Nehezebben alakulnak ki eljárások

Összetett szervezeti modellek

Funkcionális

Koordinációs

Átfedési

Rendelkezésre bocsátási

Projektcsapat

MÁTRIX

Funkcionális szervezet

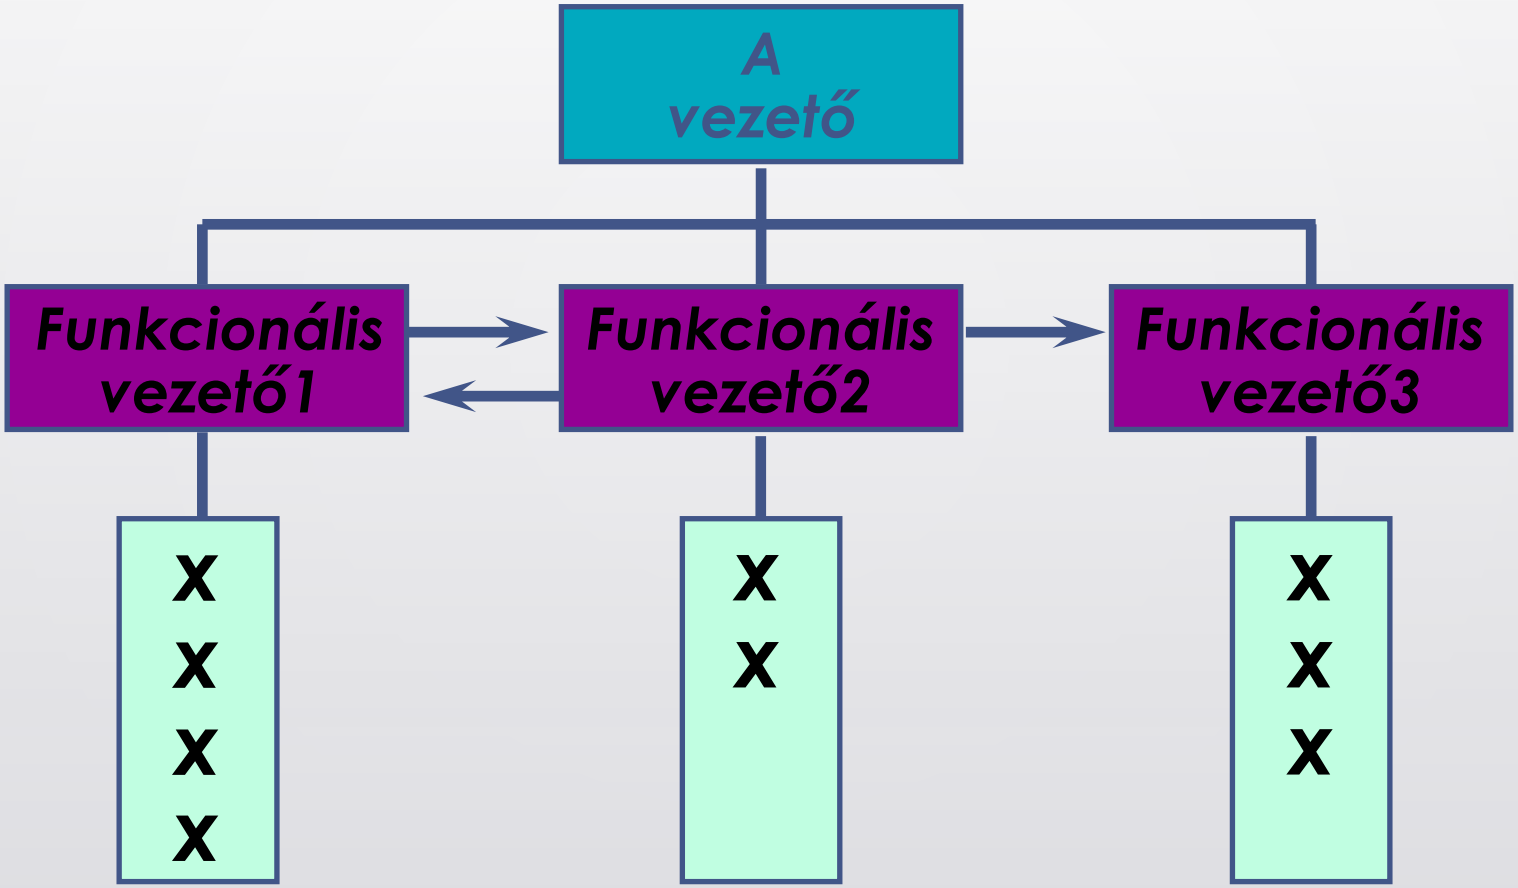

Funkcionális szervezet

Előnyök

- Összpontosítja a szakértelmet
- Jó egyéni fejlődési lehetőség
- Az eljárások javítására összpontosít

Hátrányok

- Nincs projekttulajdonos
- Gyenge kommunikáció
- Az erőforrás - kihasználtságot kevéssé figyelik
- Alacsony projekt ösztönzés
- Rugalmatlan struktúra
- Nincs projektkultúra

Koordinációs (gyenge) mátrix

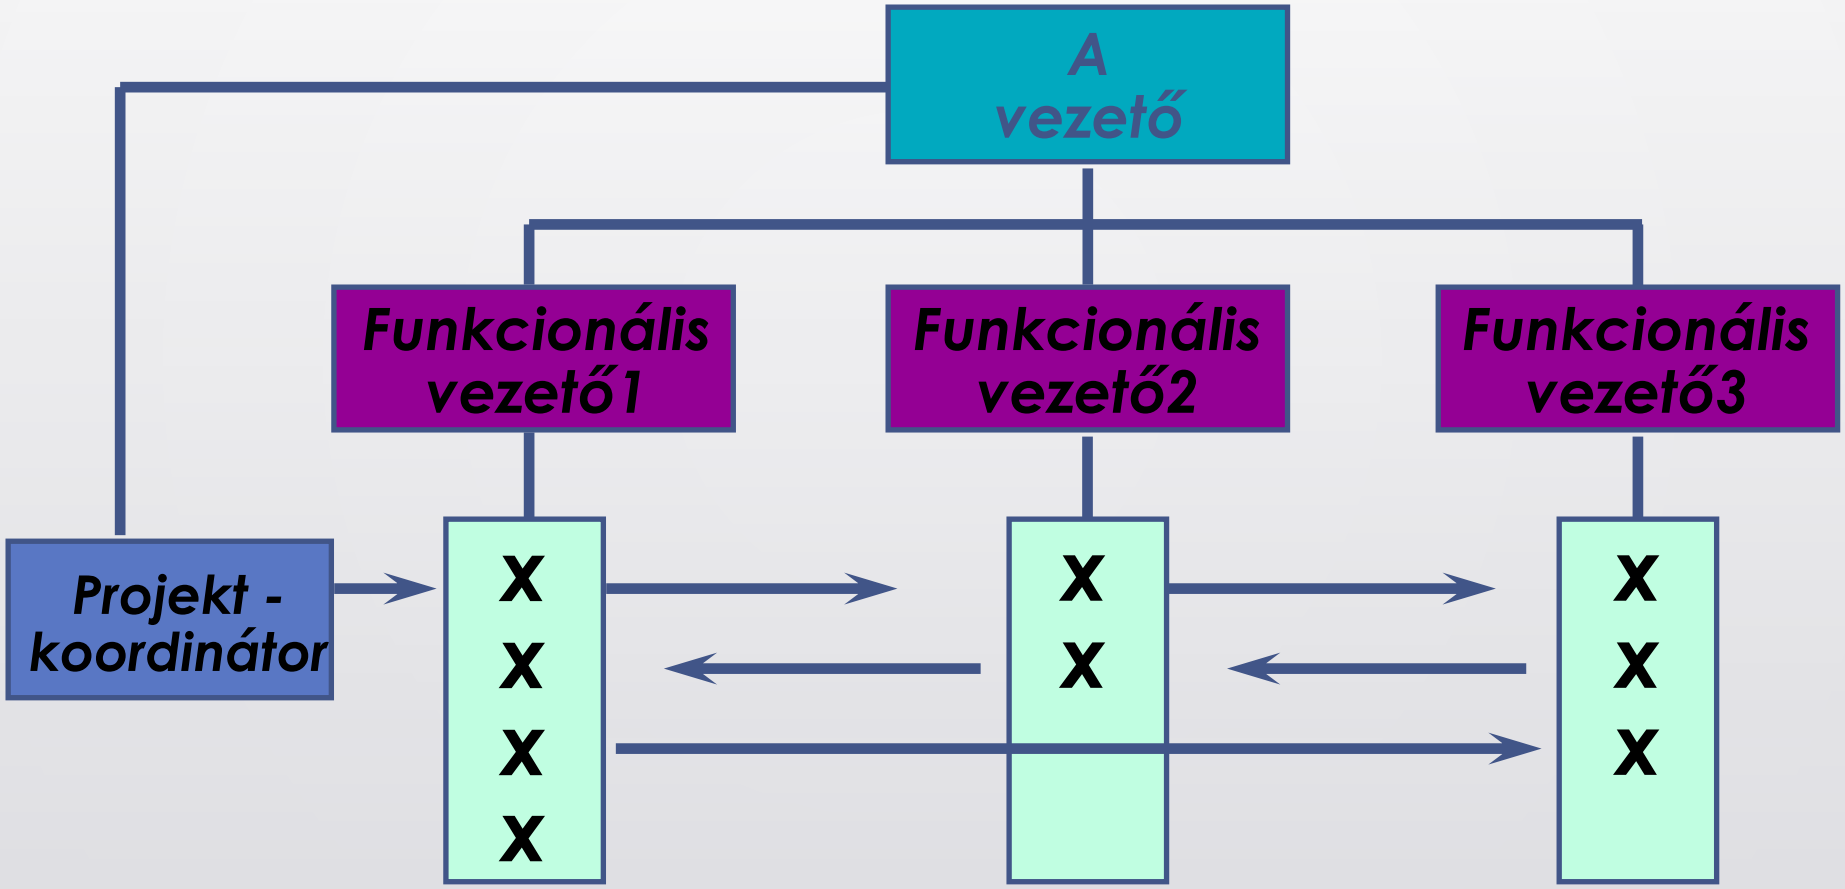

Koordinációs mátrix

Előnyök

- Összpontosítja a szakértelmet
- Jó egyéni fejlődési lehetőség
- Az eljárások javítására összpontosít

Hátrányok

- Nincs projekttulajdonos
- Alacsony projekt ösztönzés
- Rugalmatlan struktúra
- Az erőforrás kihasználtságot kevéssé figyelik

Átfedési (kiegyensúlyozott) mátrix

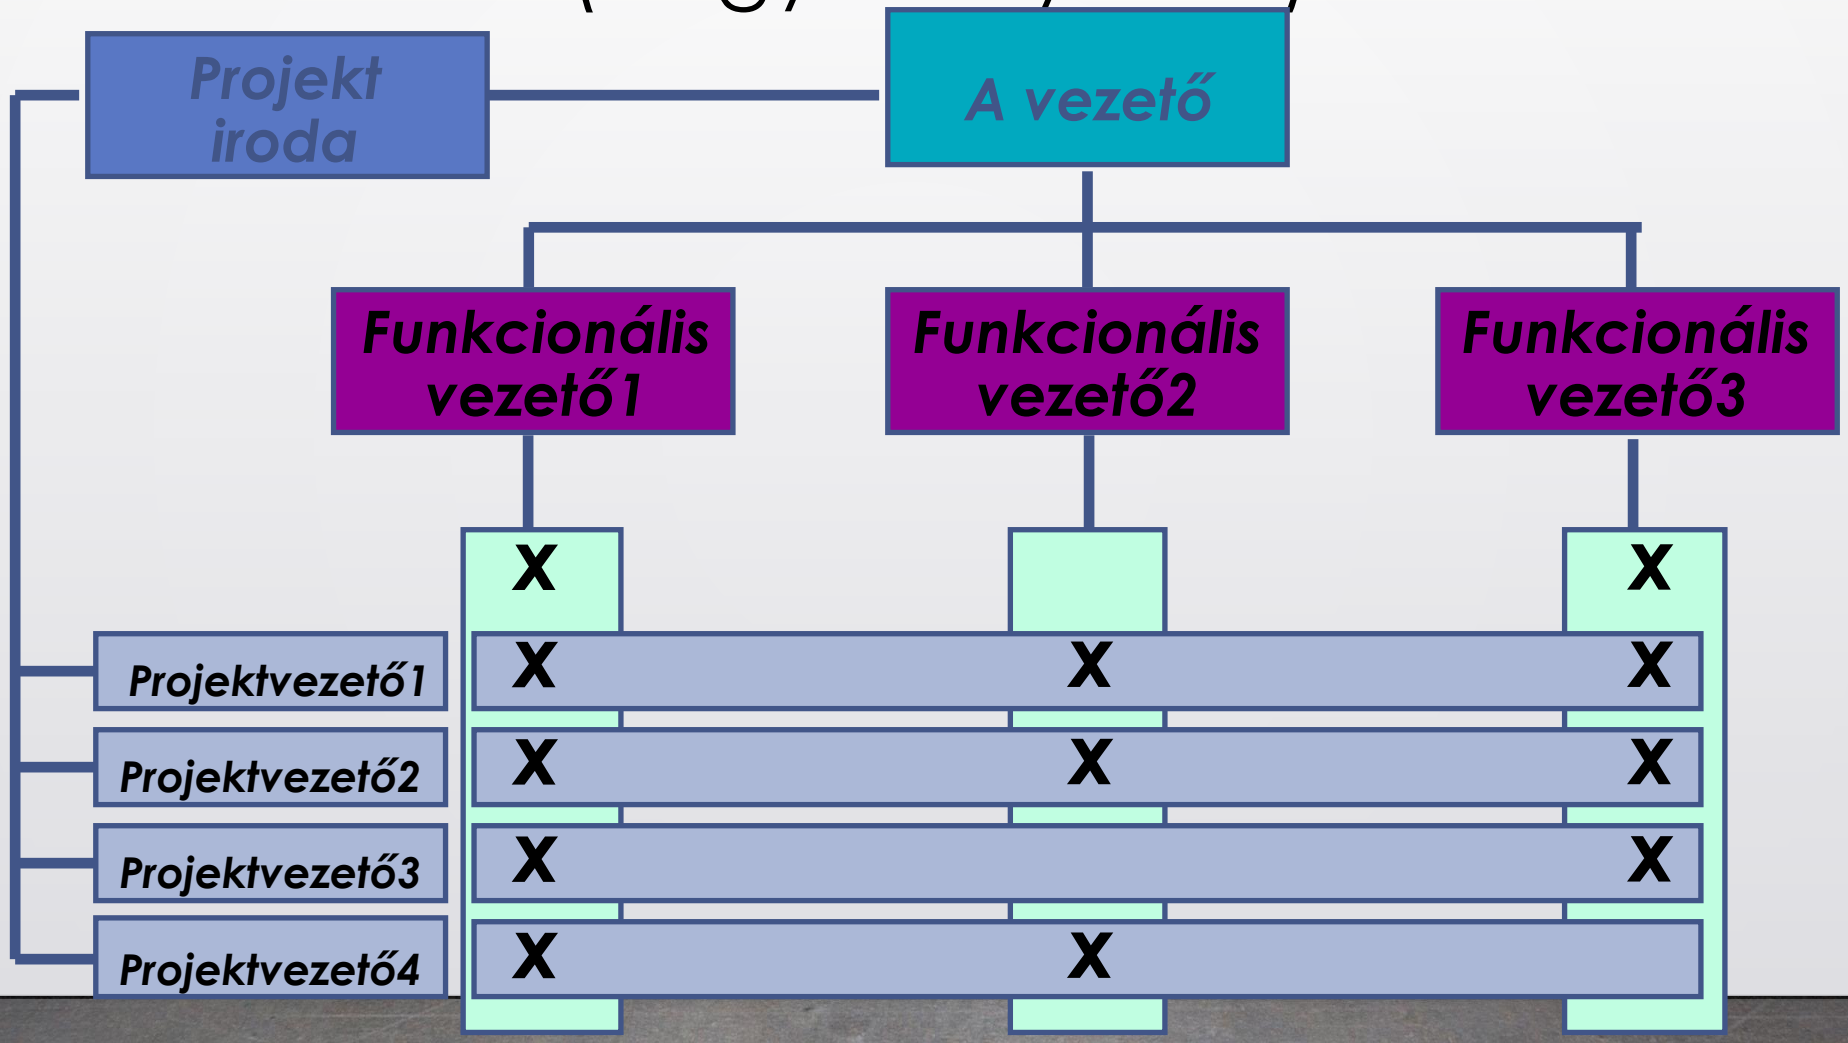

Átfedési mátrix

Előnyök	*Hátrányok*
• Széles szakértelmű csapat • Van projekttulajdonos • A szakértő csoportok fejlődése biztosított • Rugalmas	• Erőforrás konfliktusok • Ösztönzés nehéz • Szakértők állandóságának hiánya

Rendelkezésre bocsátási (erős) mátrix

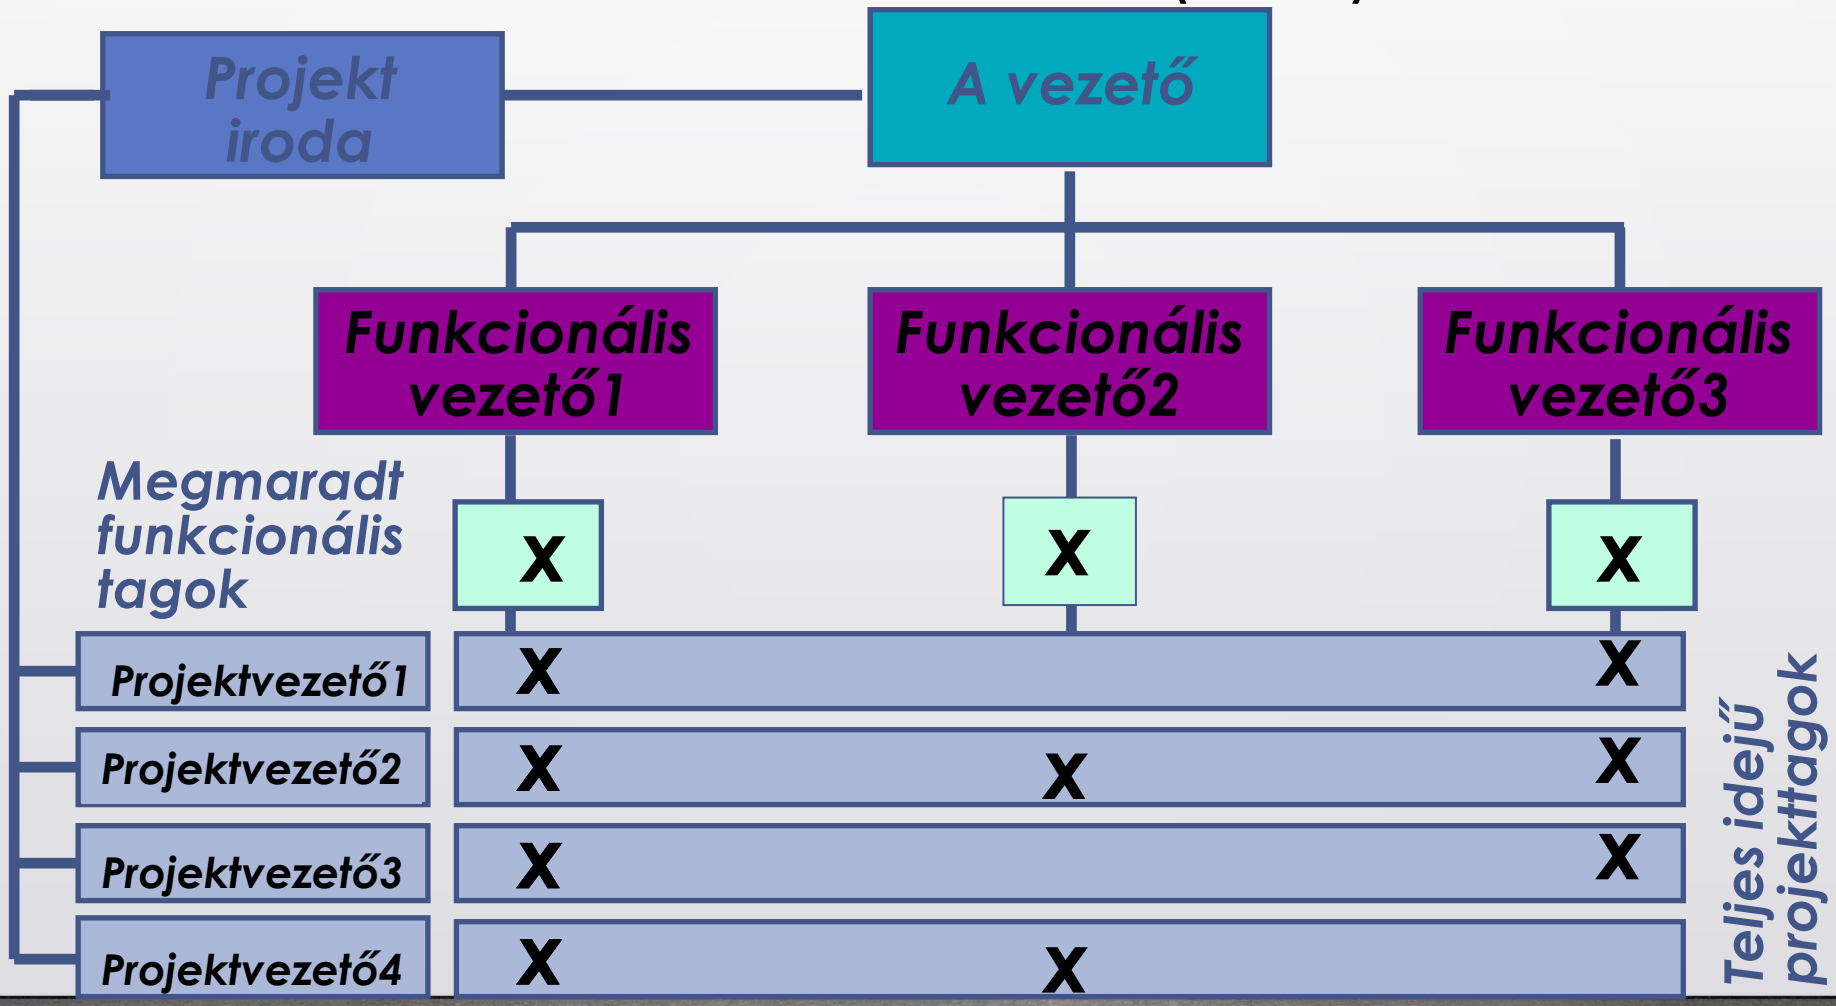

Rendelkezésre bocsátási mátrix

Előnyök	*Hátrányok*
• Egyének mobilitása • Összpontosított csapatok • Projekt-ösztönzés	• Nehezebb fejlődés • A funkcionális osztályok folytonossága nehezen biztosítható

Projektcsapat

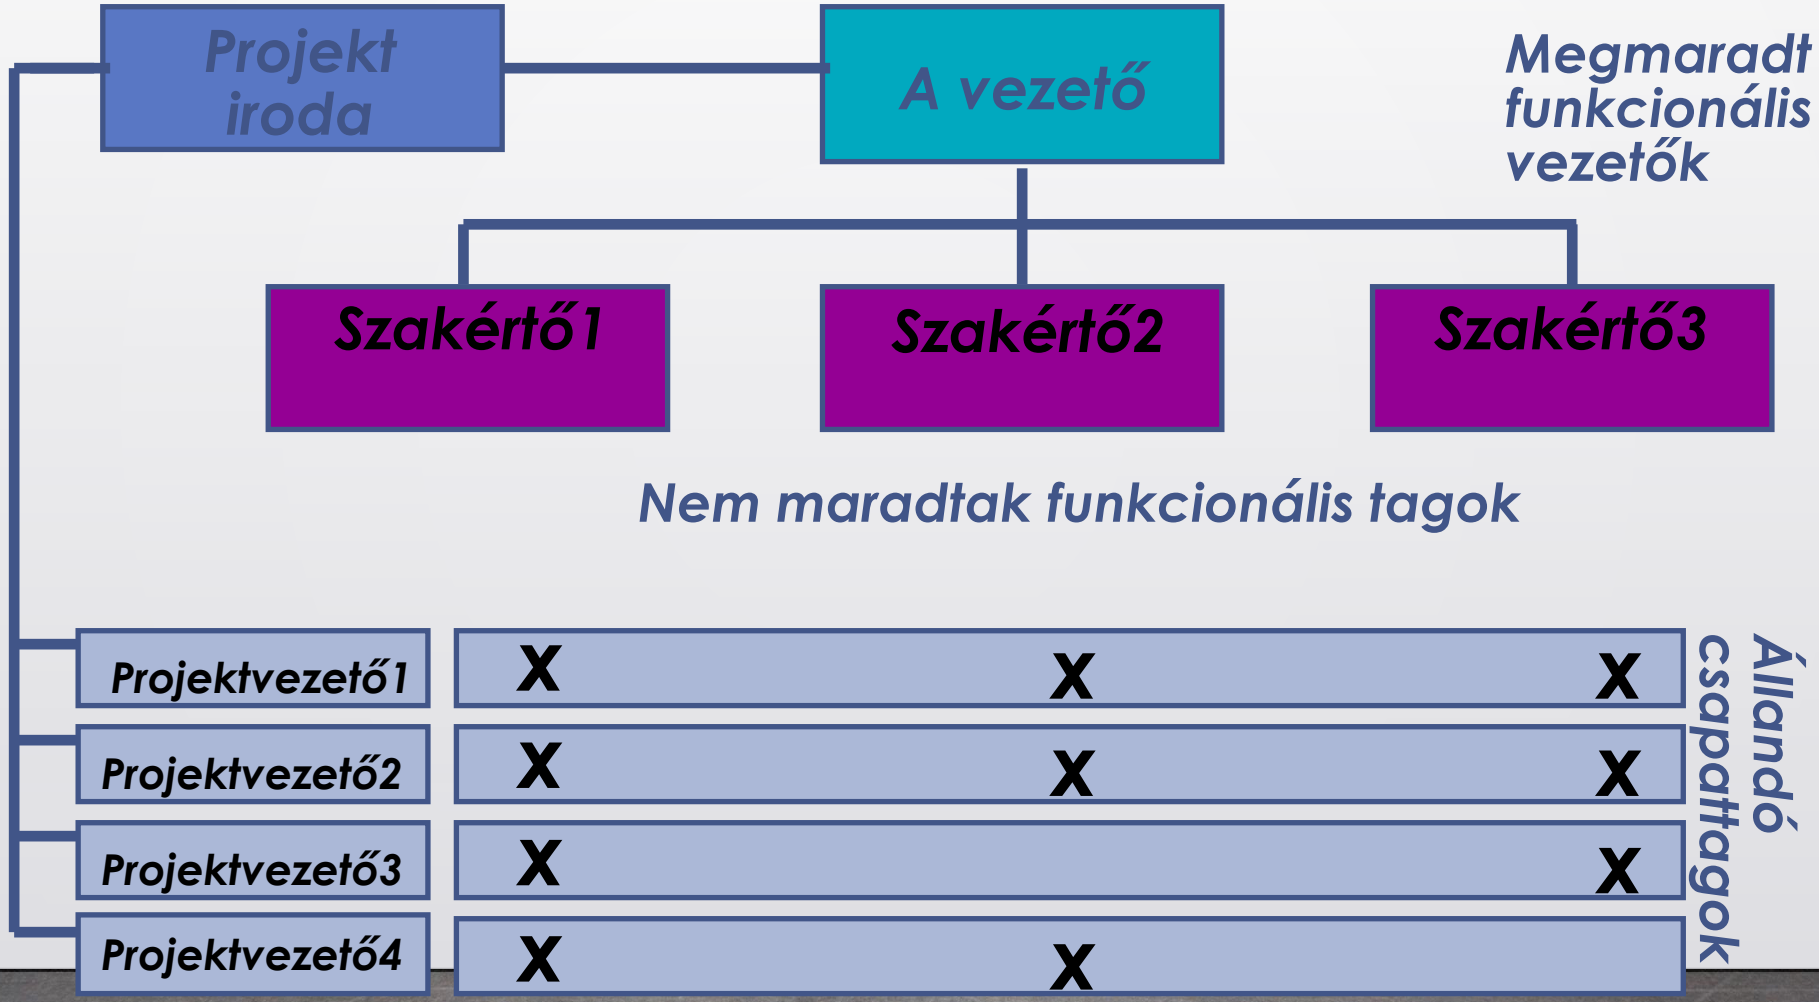

Projektcsapat

Előnyök

- Erős projekt ösztönzés
- Széles projektvezetői hatáskör
- Széles szakértelmű csapat
- Egyértelműen hozzárendelt projekterőforrások

Hátrányok

- Erőfeszítések megismétlése
- Szakértelem összpontosítása elvész
- A projektcsapatok közötti interaktivitás hiánya
- Korlátozott lehetőség az eljárások javítására

17

Milyen szempontok szerint választanál szervezeti modellt?

A megfelelő szervezeti modell választásának szempontjai

- % folyamatos, ismétlődő, egyedi feladatok
- A projektek száma és gyakorisága
- A projektek hossza
- Az elérhető erőforrások és szakértelmek
- A folyamatos részvétel szükségessége
- A projektek kereskedelmi súlya
- A vállalati kultúra

A megfelelő szervezeti modell választásának szempontjai

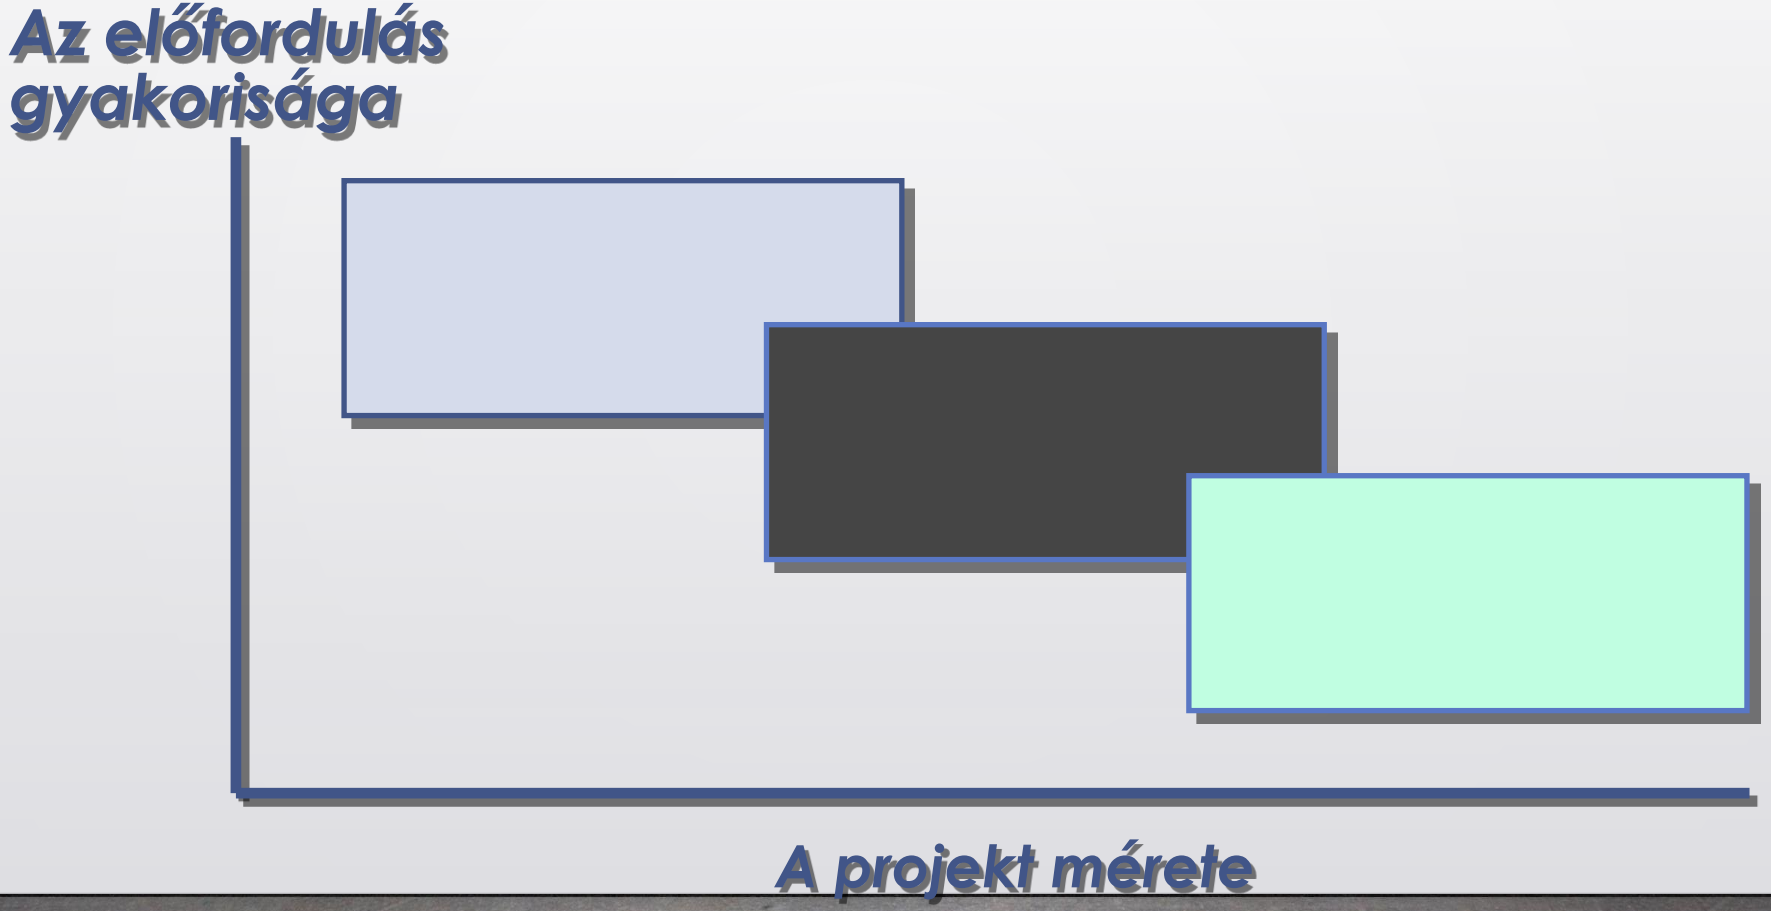

A megfelelő szervezeti modell választásának szempontjai

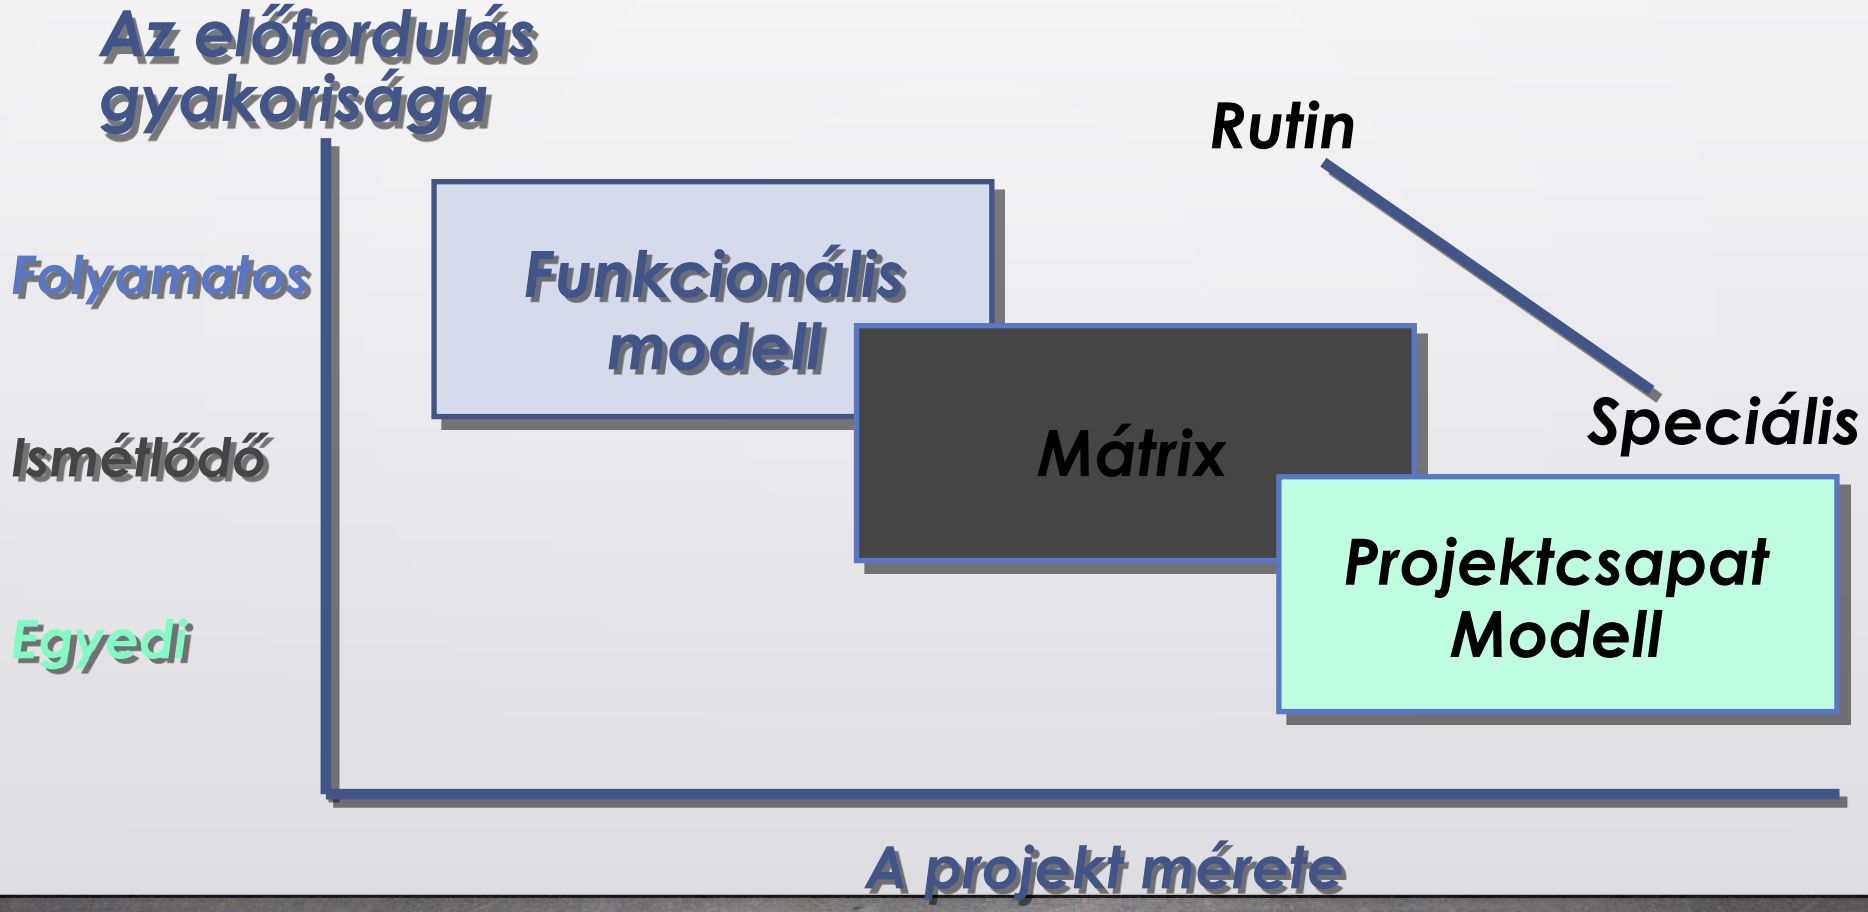

Projektszerepek

Hagyományos projektszerepek

- Projekttulajdonos (szponzor) - felsővezetői szerep
- Erőforrás-kezelő - felsővezetői szerep
- Projektvezető
- Technikai (projekt)vezető
- Projektkoordinátor
- Projektkontroller
- Projektasszisztens
- Csapatvezető (pl. vezető fejlesztő)
- … helyettes
- Projekttag (szervező, tervező, szakértő, ITarchitekte, fejlesztő, tesztelő, dokumentátor stb.)

Projekttulajdonos szerepe

Általában a felső vezetés tagja

Kitűzi a projekt üzleti céljait

Tartja a kapcsolatot az ügyfél projekttulajdonosá val

Szerződéses kérésekben dönt

Partnere a projektvezetőnek, ha a projektvezető olyan problémába ütközik, ami kimutat a projekt szerződéses keretein

Figyeli a projektet, és ha problémát észlel, akkor intézkedik (válságkezelés)

Jó-e, ha a projekttulajdonos az első számú vezető?

?

Jó-e, ha a projekttulajdonos az első számú vezető?

- Pro:
  - Magasabban van a vállalati hierarchiában, mint a projekt bármely tagja.
  - A projektnek jó, mert könnyebben hozzájut az erőforrásokhoz.
  - Kifele demonstrálni tudja a projekt fontosságát.
- Kontra:
  - A vállalat szempontjából nem helyes, mert nem tud semleges lenni más projektekhez (hacsak nem az összesnek tulajdonosa)

A projektvezető szerepe

- A projekt egy-személyes, teljes hatáskörű vezetése a projektszerződés keretein belül
- A projekt céljainak megértése és közvetítése
- Úgy irányítani a projektet, hogy az idő, költség és minőségi célok teljesüljenek
- A projekt szervezetének létrehozása, a jelentési és kommunikációs mechanizmusok meghatározása
- A szükséges erőforrások igénylése
- A minőségügyi tevékenységek megtervezése és végrehajtásuk ellenőrzése
- A kockázatok azonosítása, kezelése
- A projekt eredményeinek folyamatos dokumentálása
- A projekt előrehaladásának irányítása, elemzése
- Jelentés a projektről a projekt tulajdonosnak és az érdekelteknek
- Emlékeztetőket, teljesítési igazolásokat aláírni a szerződés keretein belül
- A projekt rendelkezésére bocsátott erőforrások optimális kihasználása
- Felelősség és hatáskör átadása
- A projekt teljesítményé-nek értékelése
- A projektcsapat elkötelezettségé-nek és megfelelő hangulatának fenntartása
- Kommunikáció a projektben részt vevő összes féllel

Projektvezetői ismeretek és képességek

- a létrehozandó projekteredmény tartalmára vonatkozó áttekintést biztosító technikai képességek (első szakma),
- a vezetői szerepkör betöltéséhez szükséges humán képességek (feladatdelegálás, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés, stb), és
- a projektvezetési eszköztár birtoklását, ami egyrészt azok ismeretét, másrészt azok alkalmazási készségét foglalja magában (második szakma)

Az erőforrás-kezelő szerepe

- A projektek prioritásának átlátása
- Az erőforrás-konfliktusok kezelése együttműködve a projektvezetőkkel
- Az erőforrás-költségek kezelése
- Projektek ellátása megfelelő erőforrásokkal
- A felső vezetés támogatása erőforrásokra vonatkozó kérdésekben
- Erőforrásokra vonatkozó szerződések aláírása
- A holt idő és költségek csökkentése
- Megfelelő szakember-bázis fenntartása

Szerepkörök vs. szervezeti modellek

	Funkcionális	Mátrix	Projekt
Projektvezető			
Funkcionális tagok			
Projektcsapat tagok			
Erőforrás kezelő			

Szerepkörök vs. szervezeti modellek

	Funkcionális	Mátrix	Projekt
Projektvezető			
Funkcionális tagok			
Projektcsapat tagok			
Erőforrás kezelő			

A technikai vezető szerepe

A projektvezető műszaki (technológiai) helyettese (jobb keze)

Műszaki döntések előkészítése

Architektúra meghatározása

A becslések műszaki megalapozása

A feladatok műszaki lebontása és számonkérése

DE a projektnek nincs két projektvezetője!!!

A projekt szervezete

A kis projekt szervezete

- Tipikusan 3-5 fős projektek

- Egyik modell: A projektvezető egy személyben technikai vezető, sőt akár tervezhet és/vagy fejleszthet is.

- Másik modell: Egy-egy adminisztratív projektvezetőhöz sok kis projekt tartozik, de inkább csak az adminisztratív munkát végzi. Informális vezető a technikai vezető.

A közepes projekt szervezete

- 5 – 20 fős projektek

- A projektvezető és a technikai vezető szerepekhez már általában különböző munkatársak rendelődnek.
- 20 fős projekthez már teljes-munkaidős projektvezető rendelődhet.
- Megkezdődik a tovább strukturálás, (részcsapatok vezetővel, pl. fejlesztők, tervezők vagy részprojekt)

Példa egy lehetséges projekt szerkezetre közepes projekt esetére

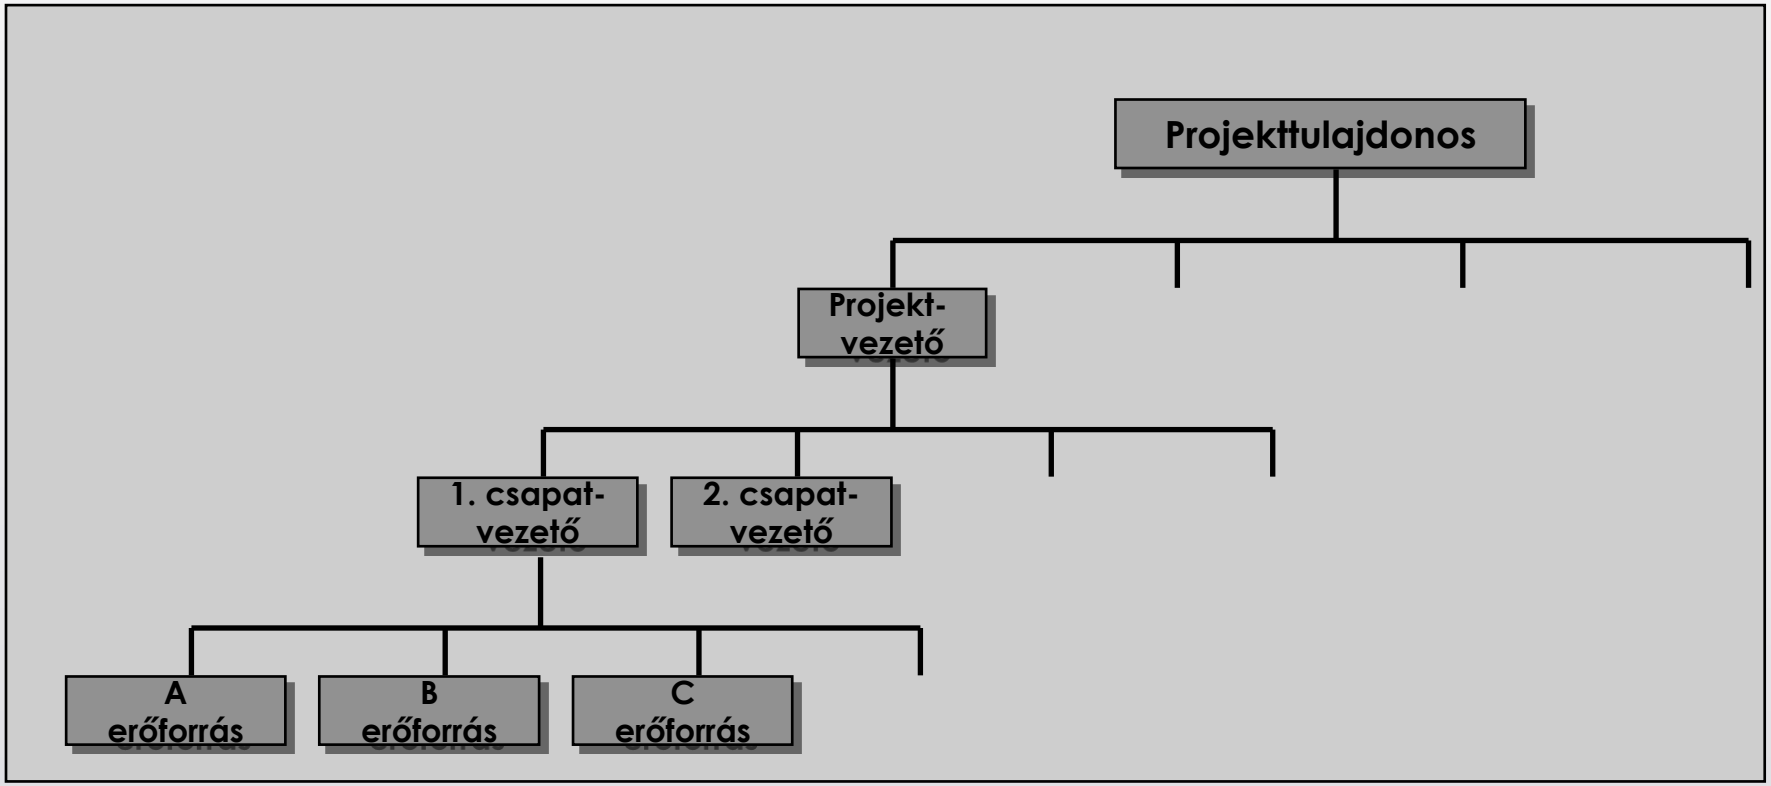

A nagy projekt szervezete

- Projekt felügyelő bizottság

- Projektiroda
- Asszisztensek, projektkontroller segítség a projektvezetőnek
- Projektvezető-helyettesek különböző szerepekkel (nemcsak távolléti helyettesítés)
- Bejöhetnek további vezetési szintek

A nagy projekt szervezet

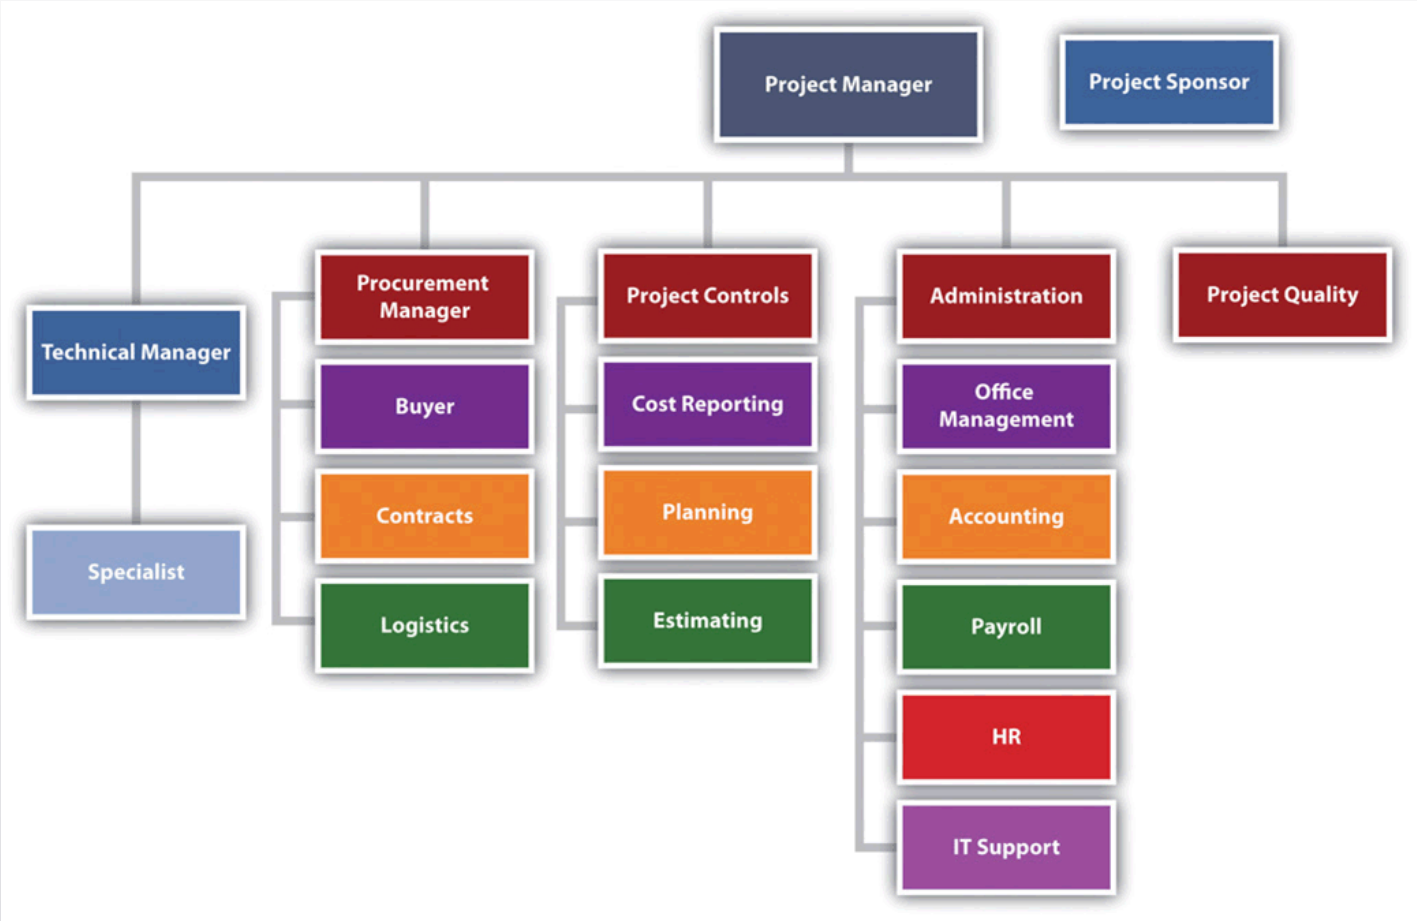

Miért érdemes alvállalkozókat alkalmazni?

Miért érdemes alvállalkozókat alkalmazni?

- Erőforrás és/vagy képesség hiánya
- Az alvállalkozó specialista egy területen
- Az ügyfél kívánságának kielégítése
- Kereskedelmi célszerűség (pl. olcsóbb)
- Üzlet és/vagy partnerpolitikai szempont

Ráfordítás alapon vagy fixárasan?

Ráfordítás alapú	**Fixáras**
Nem tudunk leválasztani részfeladatot	Jól definiált részfeladat, jól definiált kapcsolatokkal
A teljes projektkockázat a fővállalkozóé	Alvállalkozó átvállal kockázatot
Rugalmasabban allokálható csapat	Szigorúbb átadás-átvétel projekten belül is
Az alvállalkozó a ráfordítás maximalizálásában érdekelt	Az alvállalkozó a ráfordítás minimalizálásában érdekelt

Az alvállalkozó kiválasztása

- **Nem versenyeztetve**
  - Ár?
  - Hírnév?
  - Anyagi helyzet ?
  - Versenytárs-e?
  - Elfogadja-e az ügyfél játékszabályait (vagy a miénket)?
  - Elfogadható-e az ügyfélnek?
- **Versenyeztetve**
  - Megéri-e a költséget?
  - Jól kidolgozott specifikáció és
  - Kiértékelési eljárás kell!

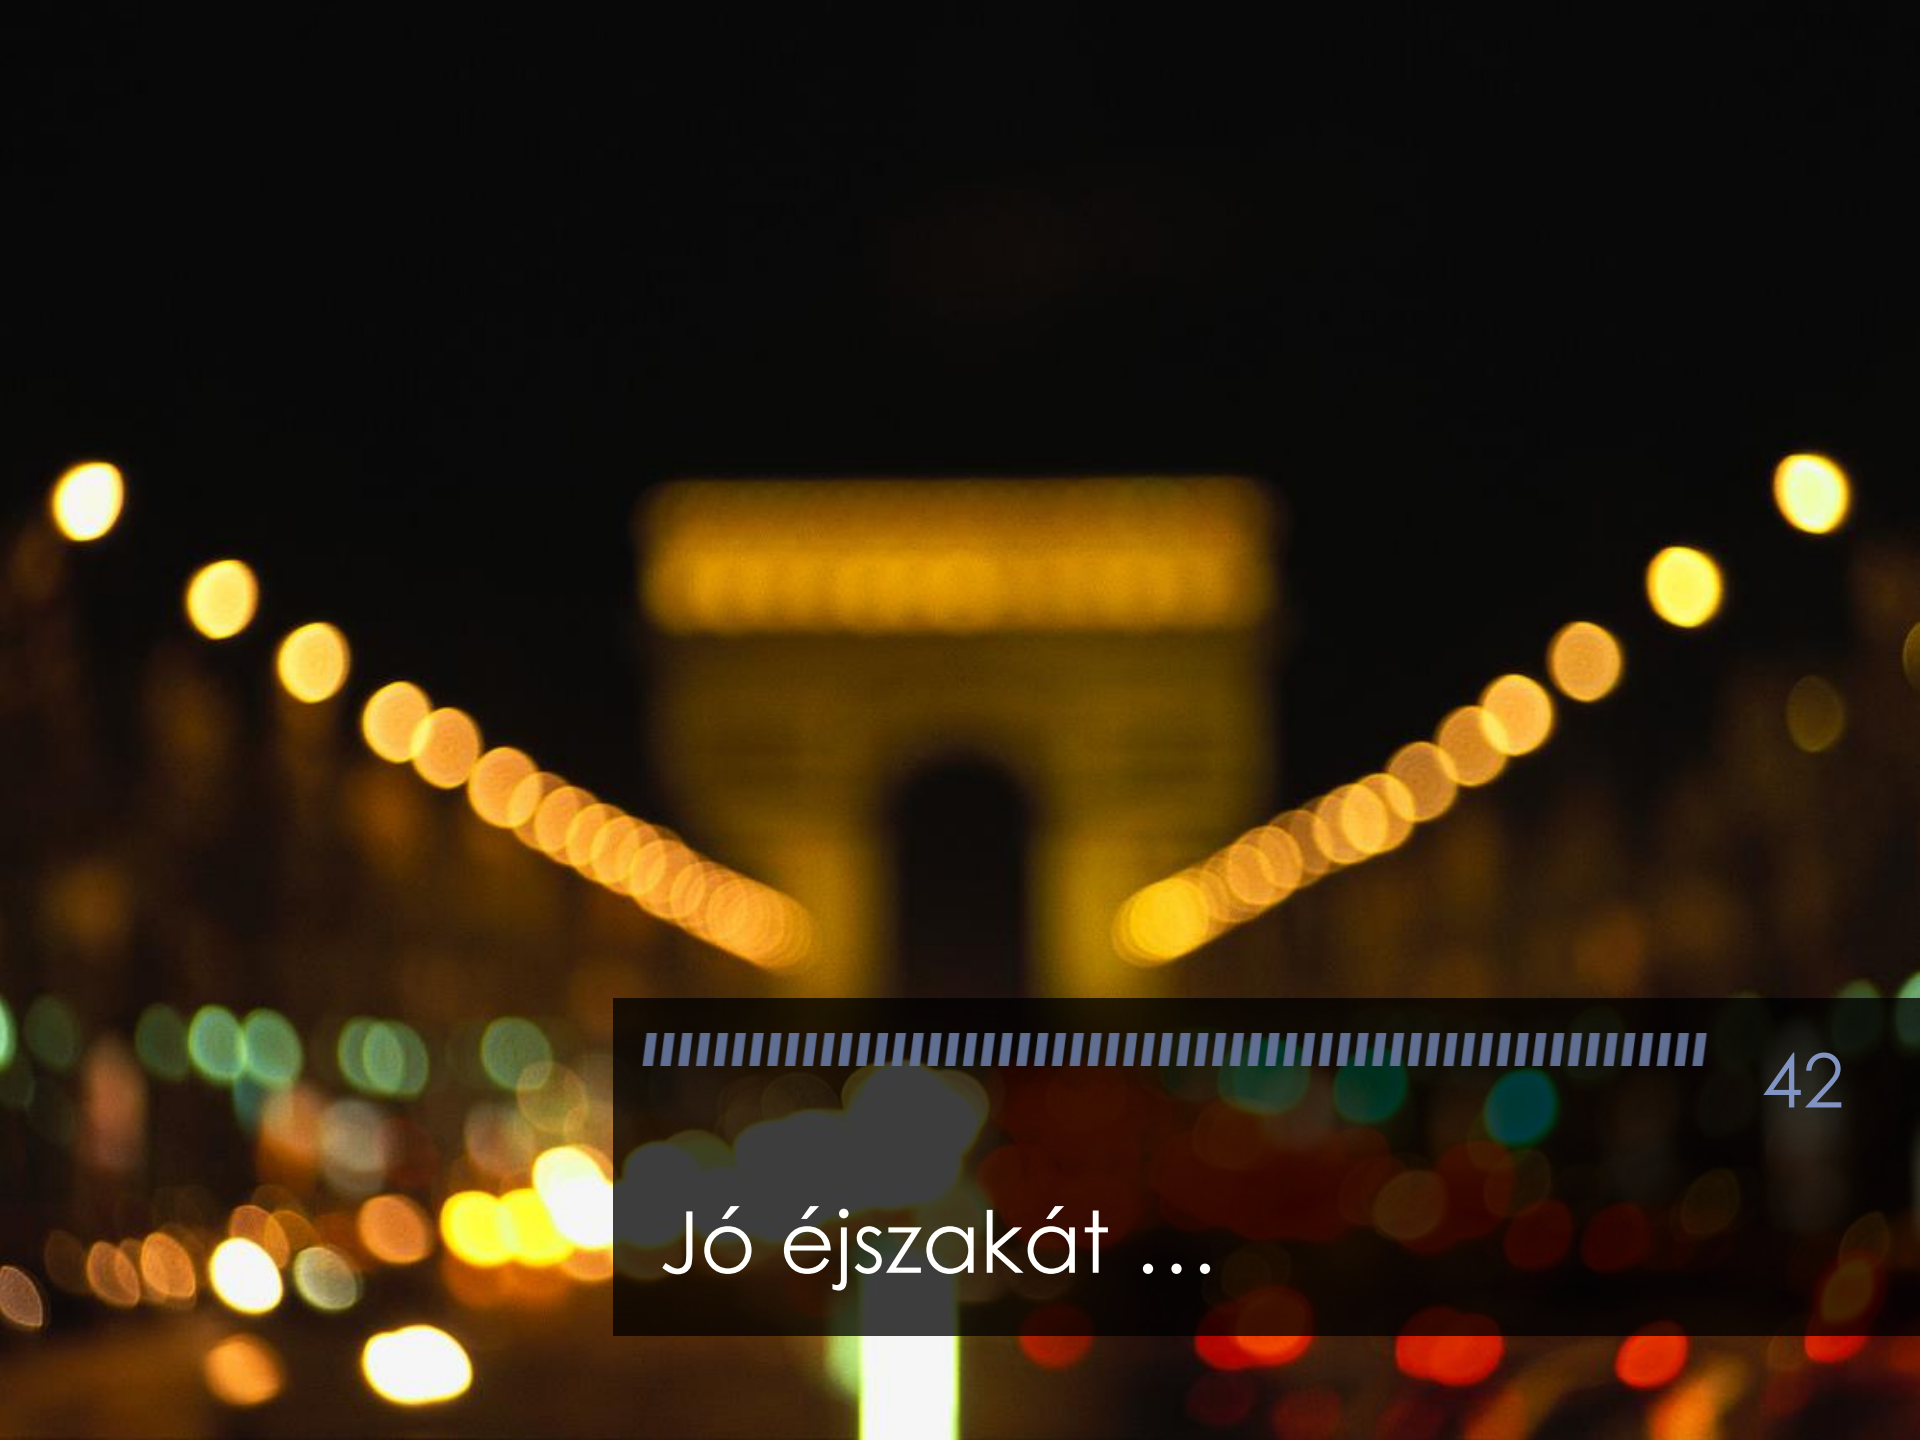

Jó éjszakát …
